Corte di Appello di Catania
Ministero della Giustizia

Lavori di ristrutturazione (....), per la realizzazione di n° 50 postazioni di lavoro [....], impianto di condizionamento, impianto di illuminazione [....], sia del Palazzo di Giustizia che in quelli di via Guardia della Carvana della Corte di Appello di Catania [....] nell'edificio adibito a ufficio giudiziario, sito in Catania, Piazza Verga, ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (convertito in L. n.120/2020)*, così come modificato dall'art. 51 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - CUP: J67G22000000001 - CIG: 9114459182

STAZIONE APPALTANTE
Corte di Appello di Catania

Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Angela LOMBARDO

Progettazione e Direzione Lavori

Studio Tecnico Ingegneria Strutturale ed Impianti
dott. Ing. Salvatore TORRE
Via Nizzeti, 65 - 95030 Tremestieri Etneo (CT)
tel. 3357429426
ingtorresalvatore@gmail.com - salvatore.torre5@ingpec.eu

Revisione	0 1 **2** 3 4	ELABORATO GRAFICO	Tav.07
		OTTOBRE 2022	
PROGETTO ESECUTIVO			Cronoprogramma - Gantt

RIEPILOGO:Prev. 05/01/2023 - 03/07/2023 = 180 gg. Giorni lavorativi Prev.124 gg - Date Fittizie

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI
Corte di Appello di Catania	348.188,27			
Impianti				
[SQ20] elettrico e dati	94.470,81	10/01/2023	16/06/2023	158
[SQ22] climatizzazione	90.370,64	20/01/2023	16/05/2023	117
[SQ20] quadri elettrici e cablag	22.199,45	15/01/2023	12/05/2023	118
Servizi Igienici				
[SQ08] opere edili	8.968,08	05/01/2023	27/01/2023	23
[SQ23] impianti idrici- elettric	13.484,89	10/01/2023	23/02/2023	45
[SQ08] infissi	6.232,18	20/01/2023	13/02/2023	25
Opere Edili Varie				
[SQ08] Opere Edili Varie	81.194,02	25/01/2023	03/07/2023	160
infissi				
[SQ08] finestre e porte	28.491,71	01/03/2023	28/06/2023	120
Sicurezza	0,00			
Sicurezza				
[SQ08] Sicurezza	2.776,49	05/01/2023	03/07/2023	180
PARZIALI	------			
PROGRESSIVI	------			
MESE	------			

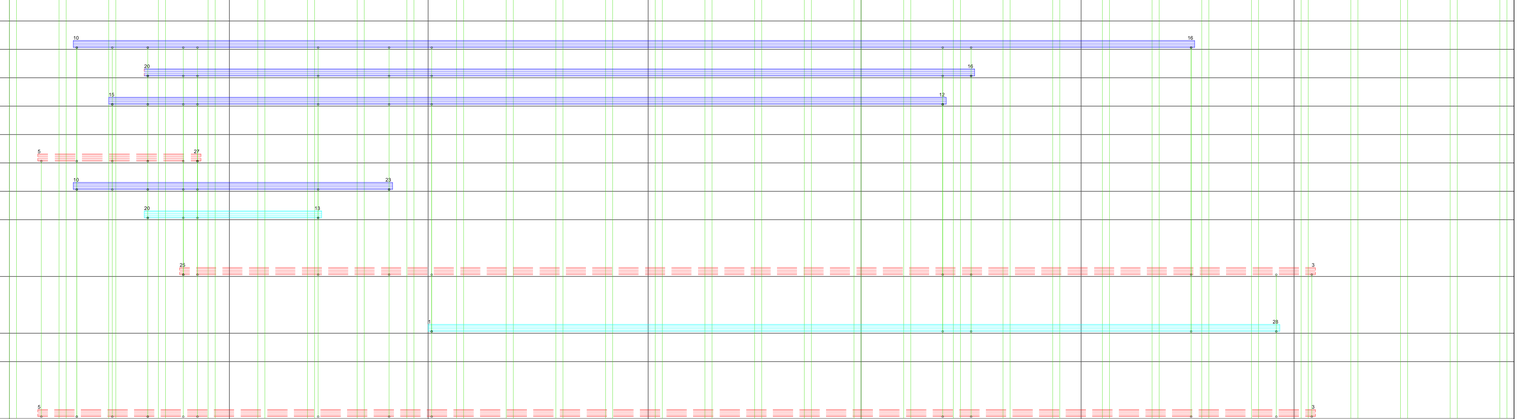

	GENNAIO/23	FEBBRAIO/23	MARZO/23	APRILE/23	MAGGIO/23	GIUGNO/23	LUGLIO/23
PARZIALI	48.403,04	70.352,83	77.018,26	60.275,16	57.723,14	33.663,33	752,51
PROGRESSIVI	48.403,04	118.755,87	195.774,13	256.049,29	313.772,43	347.435,76	348.188,27
MESE	GENNAIO/23	FEBBRAIO/23	MARZO/23	APRILE/23	MAGGIO/23	GIUGNO/23	LUGLIO/23

2 IMPRESA CLIMATIZZAZIONE, ELETTRICO, IDRAULICA
1 IMPRESA EDILE
3 SERRAMENTISTA
